



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informácia o stave implementácie Programu Slovensko k 17. 04. 2026

Obsah

1. Základné informácie o Programe Slovensko.....	3
2. Aktuálny stav implementácie P SK k 17. 04. 2026 a pokrok od 01. 01. 2026	4
3. Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty.....	4
4. Plnenie pravidla N+3.....	5
5. Opatrenia na akceleráciu implementácie	6
5.1 Zmena Programu Slovensko a realokácia finančných prostriedkov	6
5.2 Zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK.....	7

1. Základné informácie o Programe Slovensko

Program Slovensko (ďalej len „P SK“) je investičným nástrojom pre rast životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. P SK upravuje podmienky pre využitie finančných prostriedkov politiky súdržnosti Európskej únie v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027.

Prostredníctvom P SK sa realizujú investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu + (ďalej len „ESF+“), Kohézneho fondu (ďalej len „KF“) a Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“). P SK nahrádza doterajších 6 operačných programov Slovenskej republiky pre fondy Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

V rámci P SK sa podarilo presadiť, že **2,41 mld. EUR z celkovej obálky 12,59 mld. EUR** (t. j. 19,15 %) je realizovaných cez **mechanizmus integrovaných územných investícií** (ďalej len „ÚI“), ktoré reprezentujú pilotný prístup viacúrovňového strategického plánovania a prioritizácie investičnej podpory v území podľa príkladov dobrej praxe v ostatných členských štátoch Európskej únie. Dopytovú súťaž samospráv po prvýkrát na Slovensku nahrádza motivácia územných partnerov spoločne identifikovať kľúčové strategické rozvojové investície, pri ktorých sú základnými predpokladmi

- a) územná dohoda o potrebe investície a
- b) pripravenosť projektov.

Riadiacim orgánom pre P SK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“). **Funkciu platobného orgánu a orgánu auditu pre P SK plní Ministerstvo financií Slovenskej republiky** (ďalej len „MF SR“). Časťou výkonu úloh, ktorými sú najmä vyhlasovanie výziev, respektíve výber a implementácia projektov, poveril riadiaci orgán pre P SK **10 sprostredkovateľských orgánov**, ktorými sú:

1. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“),
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“),
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“),
4. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVM SR“),
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“),
6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“),
7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“),
8. Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“), a to za oblasť podpory rómskych komunit,
9. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), a to za oblasť výkonu kontroly verejného obstarávania,
10. Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“).

Tabuľka č. 1 Rozdelenie alokácie v rámci P SK (v EUR)

Implementujúci subjekt	Alokácia
MD SR	3 384 282 748
MIRRI SR	2 432 893 790
MPSVR SR	1 812 615 613
MŽP SR	1 576 863 107
MŠVVM SR	1 021 277 277

SIEA	896 271 945
MH SR	572 825 210
ÚV SR	431 500 000
MZ SR	366 482 422
MV SR	98 722 821
Spolu Program Slovensko	12 593 734 933

Zdroj: Riadiaci orgán pre P SK - Alokácie jednotlivých sprostredkovateľských orgánov platné od 25.02.2026 (podľa Finančného plánu v. 4.1)

Investície z P SK smerujú do oblastí podpory/priorít **v 5 cieľoch politiky súdržnosti Európskej únie a 1 samostatného špecifického cieľa:**

- CP1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa
- CP2 – Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa
- CP3 – Prepojenejšia Európa
- CP4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa
- CP5 – Európa bližšie k občanom
- Fond na spravodlivú transformáciu

2. Aktuálny stav implementácie P SK k 17. 04. 2026 a pokrok od 01. 01. 2026

Alokácia: 12,59 mld. EUR
Vyhlásené výzvy: 363 v objeme 11,29 mld. EUR, t.j. 89,65 % alokácie
Kontrahovanie: 8,16 mld. EUR, t.j. 64,82 % alokácie
Čerpanie: 2,05 mld. EUR, t.j. 16,30 % alokácie
Počet predložených žiadostí: 7 195, z ktorých bolo zatiaľ **schválených 4 167.**

Pokrok od 01. 01. 2026:

- **Nárast vo vyhlásených výzvach o 14 výziev vo výške 254,86 mil. EUR (z 87,6 % na 89,7 %)**
- **Nárast kontrahovania o 892,90 mil. EUR (z 57,7 % na 64,8 %)**
- **Nárast čerpania o 441,00 mil. EUR (z 12,8 % na 16,3 %)**

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

3. Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty

Na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu pre P SK sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) bola riadiacim orgánom pre P SK pridelená jednotlivým sprostredkovateľským orgánom zodpovednosť za implementáciu časti alokácie P SK.


Na implementácii P SK sa podieľa spolu 10 implementujúcich subjektov (sprostredkovateľských orgánov).

Tabuľka č. 2 Prehľad stavu implementácie P SK podľa jednotlivých implementujúcich subjektov k 17. 04. 2026

Rezort	Alokácia EÚ zdroj	Výzvy		Kontrahovanie		Čerpanie	
		EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie	EÚ zdroj	% z alokácie
MD SR	3 384 282 748	3 112 312 290	92,0%	2 545 045 255	75,2%	597 093 652	17,6%
MIRRI SR	2 432 893 790	2 086 171 977	85,7%	1 244 953 906	51,2%	181 197 165	7,4%
MPSVR SR	1 812 615 613	1 805 299 203	99,6%	1 319 050 948	72,8%	508 410 210	28,0%
MŽP SR	1 576 863 107	1 514 953 361	96,1%	1 021 244 506	64,8%	149 740 291	9,5%
MŠVVM SR	1 021 277 277	811 921 804	79,5%	686 010 799	67,2%	267 760 936	26,2%
SIEA	896 271 945	786 252 035	87,7%	515 298 231	57,5%	151 113 689	16,9%
MH SR	572 825 210	422 523 414	73,8%	300 138 977	52,4%	69 772 651	12,2%
ÚV SR	431 500 000	367 299 563	85,1%	285 676 163	66,2%	87 145 341	20,2%
MZ SR	366 482 422	299 175 063	81,6%	178 636 138	48,7%	13 028 167	3,6%
MV SR	98 722 821	84 671 102	85,8%	67 490 777	68,4%	27 722 195	28,1%
celkom P SK	12 593 734 933	11 290 579 813	89,7%	8 163 545 699	64,8%	2 052 984 296	16,3%

Zdroj: ITMS21+ (export dát 20. 04. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

Graf č. 1 Porovnanie stavu implementácie jednotlivých implementujúcich subjektov k 17. 04. 2026

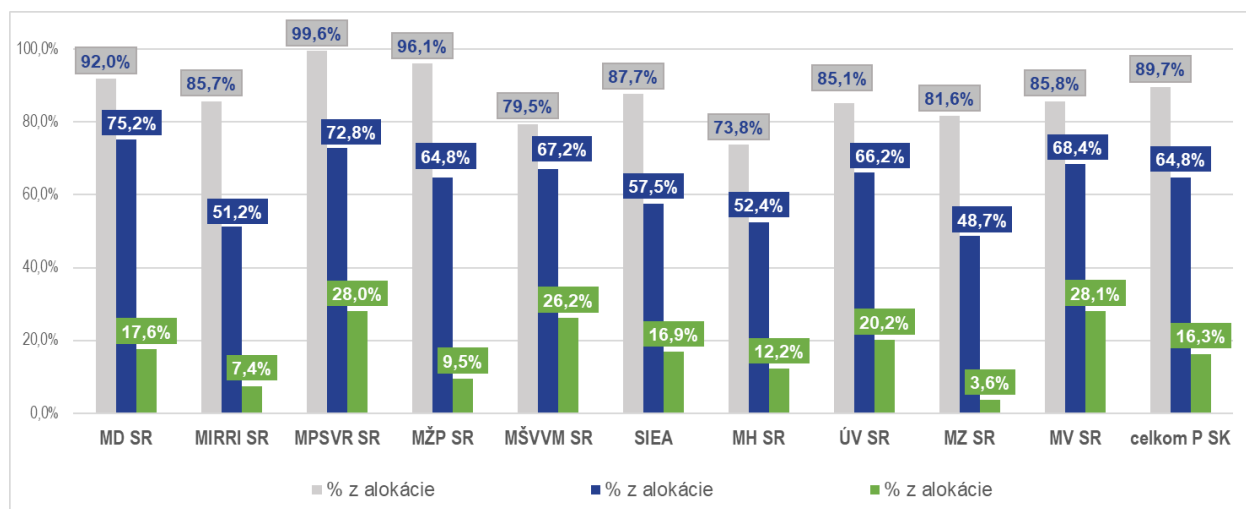

Zdroj: ITMS21+ (export dát 20. 04. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

4. Plnenie pravidla N+3

Rok 2025

K 31. 12. 2025 bolo potrebné vyčerpať minimálne 1,47 mld. EUR v rámci P SK.¹ Tento limit sa podarilo splniť už k 30. 11. 2025 a k 31. 12. 2025 bolo dosiahnuté 110 %-né plnenie finančného záväzku na rok 2025.

Rok 2026

K 31. 12. 2026 bude potrebné vyčerpať kumulatívne minimálne 2,21 mld. EUR v rámci P SK. Aktuálne ostáva vyčerpať ešte 217,82 mil. EUR. Minimálny objem čerpania v roku 2026 bol

¹ Kumulatívna suma N+3 pre rok 2025 a 2026 bola znížená k 31. 07. 2025 na základe vyplatenia zálohy na STEP (30 % z alokácie 1P3)

výrazne znížený,² a to najmä zásluhou využitia nových priorít a flexibilit v rámci nového legislatívneho balíka Európskej únie s názvom „Modernizovaná politika súdržnosti“, prostredníctvom predloženia revízie P SK na schválenie Európskej komisii v termíne do 31. 12. 2025.

Riziko prepadnutia prostriedkov v roku 2026 je nízke, avšak v nasledujúcich rokoch 2027 – 2028 a predovšetkým ku koncu programového obdobia riziko výrazne narastá. Ročné sumy, ktoré bude potrebné v roku 2027, 2028 a 2029 čerpať sa pohybujú vo výške približne 2,09 mld. EUR a v roku 2030 bude potrebné vyčerpať viac ako 4,10 mld. EUR, čo pri doterajšej ročnej úrovni čerpania predstavuje potrebu výrazného zvýšenia čerpania jednotlivými SO/IS MIRRI SR. Zároveň je potrebné vziať do úvahy aj začiatok implementácie nového programového obdobia 2028 – 2034, čo v rokoch 2028 až 2030 pri prelínaní dvoch programových období a potrebe rýchleho začatia implementácie nového programového obdobia, bude vytvárať ešte vyšší tlak na čerpanie finančných prostriedkov a zvyšovať riziko prepadnutia finančných prostriedkov P SK.

5. Opatrenia na akceleráciu implementácie

Na zabezpečenie splnenia pravidla n+3 v roku 2026 a eliminovanie rizika dekomitmentu v ďalších rokoch prijíma RO P SK v spolupráci s poskytovateľmi súbor opatrení zameraných na 3 hlavné oblasti:

- revízia P SK a realokácie (v kontexte nových priorít EÚ – MPS a potrieb vyplývajúcich z implementačnej praxe);
- zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK;
- zrýchlenie procesov VO.

5.1 Zmena Programu Slovensko a realokácia finančných prostriedkov

Zmena P SK bola pripravená v nadväznosti na prijatie legislatívneho balíka k MPS, konkrétne nariadení (EÚ) 2021/1058 a (EÚ) 2021/1056, ktoré nadobudli účinnosť 20. 09. 2025.

Zmena programu zahŕňala **presun 10 % celkovej alokácie programu na strategické priority MPS**, ako aj ďalšie úpravy vyplývajúce z implementačnej praxe jednotlivých poskytovateľov. Týmto opatreniami boli vytvorené maximálne predpoklady na to, aby **v roku 2026 nedošlo k trvalej strate finančných prostriedkov EÚ v odhadovanej výške približne 750 mil. EUR**. Tento cieľ sa dosiahol najmä **získaním dodatočných zálohových platieb z Európskej komisie vo výške 1,37 mld. EUR**, ktoré priamo znižujú objem finančných prostriedkov potrebných na vyčerpanie v roku 2025 a 2026. Zároveň sa vytvára predpoklad na úsporu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu **vo výške približne 420 mil. EUR na zabezpečenie krytia výdavkov súvisiacich s „energopomocou“**, a to umožnením podpory financovania výstavby nemocnice v Prešove zo zdrojov P SK. Súčasne sa **obdobie oprávnenosti výdavkov predlžuje o 1 rok**, čím sa vytvára dostatočný časový priestor na realizáciu projektov.

Podpora v rámci MPS je zameraná na vytvorenie nových priorít a špecifických cieľov v piatich oblastiach:

- Konkurencieschopnosť (STEP);
- Odolnosť vodných zdrojov;
- Energetická transformácia;
- Obrana, bezpečnosť, civilná pripravenosť;
- Dostupné bývanie.

Návrh zmeny programu bol pripravený v zmysle uznesenia vlády SR č. 325 z 18. 6. 2025 (úloha B.1). Návrh rámca zmeny P SK bol schválený uznesením vlády SR č. 548 z 5. 11. 2025.

² Zníženie o ročnú a dodatočné jednorazové zálohové platby vo výške 1,43 mld. EUR.

Zmenu P SK schválil Monitorovací výbor pre Program Slovensko 2021 – 2027 dňa 9.12.2025. P SK bol Európskou komisiou **schválený Vykonávacím rozhodnutím Komisie z 18.3.2026**.

Vyhlasovanie výziev na nové oblasti podpory je naplánované od 2. Q 2026.

Výzvy sú, tam kde je to vhodné, **pripravované v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi**. V priebehu februára 2026 sa uskutočnili prvé kolá konzultácií s partnermi, zamerané na podporu investícií do dostupného a udržateľného bývania a na oblasť civilnej pripravenosti.

RO P SK aktívne spolupracuje s poskytovateľmi s cieľom zabezpečiť **včasné spustenie investícií v nových prioritách MPS**.

Ďalšia zmena P SK bude pripravená v zmysle uznesenia vlády SR č. 604 z 3. decembra 2025 **najneskôr do 15.12.2026**.

5.2 Zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK

✓ Zintenzívnenie bilaterálnych stretnutí s rizikovými sprostredkovateľskými orgánmi

Aktuálne prebiehajú bilaterálne stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov v mesačnej periodicite s každým sprostredkovateľským orgánom, resp. implementačnou sekciou. Predmetom rokovaní je diskusia k aktuálnemu stavu implementácie, podrobným vyhodnocovaním implementačných dát z rôznych pohľadov, identifikovaným rizikám a opatreniam na zrýchlenie kontrahovania a čerpania.

✓ Zosilnený režim riadenia a monitorovania implementácie FST

Riadiaci orgán zabezpečuje zosilnené riadenie implementácie Fondu na spravodlivú transformáciu, a to najmä prostredníctvom pravidelného mesačného monitorovania čerpania a pokroku na úrovni sprostredkovateľských orgánov a jednotlivých projektov. Zároveň sa kladie dôraz na projekty, pri ktorých je predpoklad rýchlejšieho čerpania, a v rámci možností sa operatívne riešia aj projekty s identifikovaným rizikom omeškania, s cieľom aspoň čiastočne znížiť koncentráciu čerpania v závere obdobia a vytvoriť predpoklady na deklarovanie výdavkov v stanovených termínoch.

✓ Pokračujúca prioritizácia kľúčových projektov (národné projekty, finančné nástroje, fázované projekty a projekty nad 5 mil. EUR)

Aj v roku 2026 prebieha pravidelné sledovanie plnenia plánov čerpania podľa jednotlivých implementujúcich subjektov. Zároveň RO bude realizovať vyhodnotenie rizikovosti jednotlivých kľúčových projektov.

✓ Vydanie aktualizácie metodického usmernenia k podpore integrovaného územného rozvoja

Riadiaci orgán zaviedol v rámci mechanizmu IÚI systém implementačných plánov, ktoré slúžia na priebežné riadenie čerpania a identifikáciu rizík dekomitmentu na úrovni jednotlivých území. Plnenie týchto plánov je pravidelne monitorované, pričom za uspokojivé sa považuje plnenie minimálne na úrovni 90 %, v opačnom prípade sa prijímajú nápravné opatrenia.

V prípade pretrvávajúceho neplnenia je možné pristúpiť k zásahom do alokácie, vrátane presunu zdrojov medzi územiaми alebo krátenia alokácie konkrétnym regiónom. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov a minimalizovať riziko dekomitmentu na úrovni Programu Slovensko.

✓ Stanovenie nových Investičných plánov pre sprostredkovateľské orgány

Plány čerpania pre rok 2026 v rámci prílohy č. 3 predstavujú jeden zo základných podkladov pre zostavenie investičných plánov jednotlivých poskytovateľov, **ktoré sa v súčasnom období finalizujú**.

Návrhy investičných plánov tvoria prílohu zmlúv o poverení uzatváraných medzi RO a SO a obsahujú stanovené **limity kontrahovania a čerpania pre jednotlivé roky**. V prípade limitov kontrahovania RO stanovuje limity na roky 2026 a 2027, pričom zámerom RO je limit kontrahovania v roku 2027 na úrovni PSK vo výške 100 %.

Pri nastavovaní limitov čerpania sa vychádzalo z dvoch hlavných princípov – z plánov čerpania jednotlivých rezortov a z minimálnych objemov, ktoré je potrebné dosiahnuť, aby Slovensko neprišlo o eurofondy podľa pravidla N+3.

Zároveň boli limity čerpania na roky 2026 až 2029 nastavené ambicióznejšie ako v predchádzajúcej verzii, keďže implementácia programu v súčasnosti zaostáva v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím 2014 – 2020.

Schválená zmena Programu Slovensko a dodatočná zálohová platba vo výške približne 1,43 mld. EUR síce výrazne znížili riziko straty prostriedkov v rokoch 2025 a čiastočne aj 2026, túto sumu však nebude možné „odložiť“ na koniec obdobia. Bude ju potrebné reálne vyčerpať a zúčtovať.

Z tohto dôvodu sú investičné plány nastavené tak, aby sa podstatná časť čerpania realizovala už v rokoch 2026 až 2029, a tým sa predišlo nadmernému tlaku na čerpanie v závere programového obdobia.

Pri nastavení limitov sa zároveň zohľadňuje aj prechod na nové programové obdobie po roku 2027, aby nedošlo k neúmernému súbehu čerpania z dvoch období v roku 2030.

✓ **Priebežný monitoring plnenia mílnika kontrahovania a limitu čerpania n+3 pre rok 2026**

✓ **Zrýchlenie verejného obstarávania (VO)**

Sprostredkovateľský orgán ÚVO (ďalej len „SO ÚVO“) má personálne kapacity takmer plne obsadené – k aktuálnemu dátumu eviduje 107,15 administratívnych kapacít, z toho 75 na pozíciách manažérov kontroly verejného obstarávania (MKVO). Od apríla 2025 došlo približne k zdvojnásobeniu počtu kapacít, čo sa premietlo aj do rastu celkového počtu vykonaných kontrol za mesiac. Napriek tomu je za posledný rok výkonnosť SO ÚVO dlhodobou nízkou. Priemerný počet ukončených kontrol na jedného MKVO predstavuje 2,7 kontroly mesačne, zatiaľ čo v programovom období 2014 – 2020 dosahoval približne 7,5 kontroly mesačne.

Výzvou naďalej zostáva zvýšenie výkonnosti týchto kapacít, najmä z hľadiska rýchlosti realizácie kontrol verejného obstarávania.

- Riadiaci orgán upravil procesne aj vecne model na analýzu rizík na výber vzorky na kontrolu zákaziek verejného obstarávania. Malo by prísť k zníženiu objemu kontrolovaných VO.
- Riadiaci orgán zároveň priebežne spolupracuje s ÚVO prostredníctvom zintenzívneného dohľadu a pravidelných koordinačných stretnutí, aby sa minimalizovali implementačné riziká a zabezpečila predvídateľnosť kontrolného procesu.
- Zároveň sa rokuje o možnosti posilnenia personálnych kapacít na strane Úradu pre verejné obstarávanie a to aj využitím kapacít, ktoré sa uvoľnia z implementácie Plánu obnovy a odolnosti.

Príloha 1: Stav implementácie P SK k 17. 04. 2026 v rozdelení na ciele politiky a priority

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Kód priority v ITMS	Názov priority	Fond	2021 – 2027	Výzvy			Kontrahovanie			Čerpanie	
					Alokácia EÚ zdroj	Počet výzev	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj
1	P1	401101	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 270 387 042	63	1 170 836 648	92,16%	208	744 383 063	58,59%	94 782 827	7,46%
	P2	401102	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	23 709 407	100,00%	1	23 709 407	100,00%	0	0,00%
	P3	401103	STEP	EFRR	231 782 399	4	59 032 399	25,47%	2	20 991 432	9,06%	0	0,00%
	P4	401104	STEP - MPS	EFRR	84 155 689	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	P5	401105	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
			CELKOM cieľ 1	EFRR	1 631 243 498	68	1 253 578 453	76,85%	211	789 083 902	48,37%	94 782 827	5,81%
2	P2P1	401201	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	13	1 149 917 141	94,53%	356	899 781 482	73,97%	373 040 346	30,67%
	P2P2	401202	Životné prostredie	EFRR/KF	1 848 486 069	52	1 815 462 518	98,21%	909	1 199 762 063	64,91%	185 625 316	10,04%
	P2P3	401203	Udržiateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 736 498	8	852 303 964	100,78%	53	354 810 228	41,95%	114 290 410	13,51%
	P2P4	401204	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	P2P5	401205	Dostupné a udržateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	P2P6	401206	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
			CELKOM cieľ 2	EFRR/KF	4 024 574 855	73	3 817 683 623	94,86%	1 318	2 454 353 772	60,98%	672 956 072	16,72%
3	P3P1	401301	Doprava	EFRR/KF	2 024 548 122	27	2 181 681 450	107,76%	279	1 952 143 693	96,42%	272 423 509	13,46%
	P3P2	401302	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
			CELKOM cieľ 3	EFRR/KF	2 562 362 895	27	2 181 681 450	85,14%	279	1 952 143 693	76,19%	272 423 509	10,63%
4	P4P1	401401	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	532 938 339	27	578 239 784	108,50%	142	455 235 581	85,42%	182 712 677	34,28%
	P4P2	401402	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 632 672	18	605 965 645	93,86%	320	526 982 466	81,62%	243 892 330	37,78%
	P4P3	401403	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	190 840 656	13	112 230 954	58,81%	39	104 664 712	54,84%	17 288 657	9,06%
	P4P4	401404	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	14	279 726 934	97,02%	146	169 770 250	58,88%	31 177 022	10,81%
	P4P5	401405	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	969 126 389	43	1 050 884 267	108,44%	137	808 291 662	83,40%	275 349 565	28,41%
	P4P6	401406	Aktívne začlenenie rómskych komunit	EFRR/ESF+	273 700 000	11	258 965 165	94,62%	660	202 141 983	73,86%	86 346 261	31,55%
	P4P7	401407	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	5	37 388 164	54,03%	54	31 680 231	45,78%	794 672	1,15%
	P4P8	401408	Potravinová a materiálna depriácia	ESF+	69 196 597	1	57 173 000	82,62%	1	57 173 000	82,62%	10 000 191	14,45%
	P4P9	401409	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	P4P10	401410	Zručnosti v civilnej pripravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
			CELKOM cieľ 4	EFRR/ESF+	3 115 328 401	119	2 980 573 912	95,67%	1 372	2 355 939 885	75,62%	847 561 377	27,21%
5	P5P1	401501	Moderné regióny	EFRR	383 215 984	6	384 296 085	100,28%	173	139 473 141	36,40%	14 614 526	3,81%
	P5P2	401502	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	P5P3	401503	Civilná pripravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
			CELKOM cieľ 5	EFRR	427 803 261	6	384 296 085	89,83%	173	139 473 141	32,60%	14 614 526	3,42%
FST	P8P1	401801	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	17	380 358 809	87,41%	55	255 569 746	58,73%	30 508 933	7,01%
	P8P2	401802	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
			CELKOM FST	FST	440 658 242	17	380 358 809	86,32%	55	255 569 746	58,00%	30 508 933	6,92%
TP	P7P1	401701	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	47	211 476 595	89,62%	59	145 742 079	61,76%	76 935 617	32,60%
	P7P2	401702	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	2	8 368 114	16,21%	3	8 368 114	16,21%	7 652 283	14,82%
	P7P3	401703	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	8	68 563 025	79,90%	12	58 871 619	68,61%	31 644 640	36,88%
	P7P4	401704	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	1	3 999 747	21,78%	2	3 999 747	21,78%	3 904 513	21,27%
			CELKOM TP		391 763 781	58	292 407 481	74,64%	76	216 981 559	55,39%	120 137 053	30,67%
			CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		12 593 734 933	363	11 290 579 813	89,65%	3 479	8 163 545 699	64,82%	2 052 984 296	16,30%

Zdroj: ITMS21+ (export dát 20. 04. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie

V prípade, že výzva alebo projekt sa týka viacerých priorít/cielov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.

Príloha 2: Stav prijatých a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) k 17. 04. 2026

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Kód priority v ITMS	Názov priority	Fond	2021 – 2027		Prijaté ŽoNFP			Schválené ŽoNFP		
					Alokácia EÚ zdroj	Počet ŽoNFP	COV	NFP	Počet ŽoNFP	COV	NFP	
1	1P1	401101	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 270 387 042	750	2 402 856 747	2 163 930 273	242	1 085 640 330	1 031 028 265	
	1P2	401102	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	29 999 376	29 999 376	1	29 999 376	29 999 376	
	1P3	401103	STEP	EFRR	231 782 399	3	42 811 608	38 988 920	2	24 814 120	20 991 432	
	1P4	401104	STEP - MPS	EFRR	84 155 689	-	0	0	-	0	0	
	1P5	401105	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0	-	0	0	
			CELKOM cieľ 1	EFRR	1 631 243 498	754	2 475 667 731	2 232 918 569	245	1 140 453 826	1 082 019 073	
2	2P1	401201	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	1 425	2 173 268 242	2 015 183 954	517	1 240 208 417	1 197 574 074	
	2P2	401202	Životné prostredie	EFRR/KF	1 848 486 069	1 577	2 320 106 092	2 184 514 736	1 063	1 675 948 350	1 591 141 169	
	2P3	401203	Udržateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 736 498	152	777 018 237	762 120 903	110	595 261 637	580 581 431	
	2P4	401204	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	-	0	0	-	0	0	
	2P5	401205	Dostupné a udržateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0	-	0	0	
	2P6	401206	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0	-	0	0	
			CELKOM cieľ 2	EFRR/KF	4 024 574 855	3 154	5 270 392 571	4 961 819 593	1 690	3 511 418 403	3 369 296 673	
3	3P1	401301	Doprava	EFRR/KF	2 024 548 122	536	2 644 830 319	2 623 237 253	309	2 502 854 611	2 485 207 402	
	3P2	401302	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	-	0	0	-	0	0	
			CELKOM cieľ 3	EFRR/KF	2 562 362 895	536	2 644 830 319	2 623 237 253	309	2 502 854 611	2 485 207 402	
4	4P1	401401	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	532 938 339	453	673 860 535	671 266 373	148	589 084 427	586 801 683	
	4P2	401402	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 632 672	431	734 894 128	708 667 431	379	702 187 762	677 590 529	
	4P3	401403	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inklúziu	EFRR/ESF+	190 840 656	100	148 009 889	144 437 118	46	130 018 266	126 854 511	
	4P4	401404	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	438	333 864 320	331 549 123	151	260 737 661	258 422 463	
	4P5	401405	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	969 126 389	198	1 184 291 897	1 170 179 992	149	1 115 359 266	1 106 405 783	
	4P6	401406	Aktívne začlenenie rómskych komunít	EFRR/ESF+	273 700 000	775	355 826 129	355 649 291	672	285 325 611	285 325 611	
	4P7	401407	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	108	56 096 572	53 433 250	68	39 653 670	37 812 496	
	4P8	401408	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	69 196 597	1	63 525 556	63 525 556	1	63 525 556	63 525 556	
	4P9	401409	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	-	0	0	-	0	0	
	4P10	401410	Zručnosti v civilnej prípravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0	-	0	0	
			CELKOM cieľ 4	EFRR/ESF+	3 115 328 401	2 110	3 550 369 026	3 498 708 134	1 483	3 185 892 218	3 142 738 632	
5	5P1	401501	Moderné regióny	EFRR	383 215 984	411	365 712 198	334 934 815	286	254 491 109	233 389 252	
	5P2	401502	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0	-	0	0	
	5P3	401503	Civilná prípravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0	-	0	0	
			CELKOM cieľ 5	EFRR	427 803 261	411	365 712 198	334 934 815	286	254 491 109	233 389 252	
FST	8P1	401801	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	160	693 725 349	503 566 030	84	562 646 882	390 446 890	
	8P2	401802	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0	-	0	0	
			CELKOM FST	FST	440 658 242	160	693 725 349	503 566 030	84	562 646 882	390 446 890	
TP	7P1	401701	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	71	240 497 694	239 462 311	63	221 531 118	220 596 750	
	7P2	401702	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	3	12 375 665	12 375 665	3	12 375 665	12 375 665	
	7P3	401703	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	13	91 733 746	91 733 746	12	80 534 100	80 534 100	
	7P4	401704	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	2	5 332 997	5 332 997	2	5 332 997	5 332 997	
			CELKOM TP		391 763 781	89	349 940 101	348 904 718	80	319 773 880	318 839 512	
			CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		12 593 734 933	7 195	15 350 637 294	14 504 089 112	4 167	11 477 530 929	11 021 937 433	

Zdroj: ITMS21+, export dát 17. 04. 2026; COV= celkové oprávnené výdavky. V prípade, že ŽoNFP sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.
