MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Informácia o stave implementácie Programu Slovensko k 30. 09. 2026

Obsah

1. Základné informácie o Programe Slovensko 3
2. Aktuálny stav implementácie P SK k 30. 09. 2026 a pokrok 4
3. Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty 5
   3.1 Prehľad vyhlasovania výziev a plnenie harmonogramu výziev na 3Q 2026 (verzia 3.1) 7
4. Plnenie pravidla N+3 8
5. Opatrenia realizované v 3. štvrťroku 2026 9
   5.1 Zmena Programu Slovensko a realokácia finančných prostriedkov 9
   5.2 Zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK 9

1. Základné informácie o Programe Slovensko

Program Slovensko (ďalej len „P SK“) je investičným nástrojom pre rast životnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. P SK upravuje podmienky pre využitie finančných prostriedkov politiky súdržnosti Európskej únie v Slovenskej republike v programovom období 2021 – 2027.

Prostredníctvom P SK sa realizujú investície z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európskeho sociálneho fondu + (ďalej len „ESF+“), Kohézneho fondu (ďalej len „KF“) a Fondu na spravodlivú transformáciu (ďalej len „FST“). P SK nahrádza doterajších 6 operačných programov Slovenskej republiky pre fondy Európskej únie v programovom období 2014 – 2020 pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

V rámci P SK sa podarilo presadiť, že **2,41 mld. EUR z celkovej obálky 12,59 mld. EUR** (t. j. 19,16 %) je realizovaných cez **mechanizmus Integrovaných územných investícií** (ďalej len „IÚI“), ktoré reprezentujú pilotný prístup viacúrovňového strategického plánovania a priorizácie investičnej podpory v území podľa príkladov dobrej praxe v ostatných členských štátoch Európskej únie. Dopytovú súťaž samospráv po prvýkrát na Slovensku nahrádza motivácia územných partnerov spoločne identifikovať kľúčové strategické rozvojové investície, pri ktorých sú základnými predpokladmi

a) územná dohoda o potrebe investície a
b) pripravenosť projektov.

Riadiacim orgánom pre P SK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „**MIRRI SR“**). **Funkciu platobného orgánu a orgánu auditu pre P SK plní Ministerstvo financií Slovenskej republiky** (ďalej len **„MF SR“**). Časťou výkonu úloh, ktorými sú najmä vyhlasovanie výziev, respektíve výber a implementácia projektov, poveril riadiaci orgán pre P SK **10 sprostredkovateľských orgánov**, ktorými sú:

1. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „MD SR“),
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“),
3. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“),
4. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVM SR“),
5. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR“),
6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“),
7. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“),
8. Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“), a to za oblasť podpory rómskych komunít,
9. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), a to za oblasť výkonu kontroly verejného obstarávania,
10. Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“).

Tabuľka č. 1 Rozdelenie alokácie v rámci P SK (v EUR)

Implementujúci subjekt	Alokácia
MD SR	3 382 120 791
MIRRI SR	2 435 055 747
MPSVR SR	1 808 615 613
MŽP SR	1 576 863 107
MŠVVM SR	1 021 277 277
SIEA	896 271 945
MH SR	572 825 210
ÚV SR	437 000 000
MZ SR	364 982 422
MV SR	98 722 821
Spolu Program Slovensko	**12 593 734 933**

Zdroj: Riadiaci orgán pre P SK - Alokácie jednotlivých sprostredkovateľských orgánov platné od 22. 07. 2026 (podľa Finančného plánu v.5.0)

Investície z P SK smerujú do oblastí podpory/priorít **v 5 cieľoch politiky súdržnosti Európskej únie a 1 samostatného špecifického cieľa:**

- CP1 – Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa
- CP2 – Zelenšia, nízkouhlíková a odolná Európa
- CP3 – Prepojenejšia Európa
- CP4 – Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa
- CP5 – Európa bližšie k občanom
- Fond na spravodlivú transformáciu

2. Aktuálny stav implementácie P SK k 30. 09. 2026 a pokrok

V 3. štvrťroku 2026 pokračoval rast všetkých hlavných ukazovateľov implementácie. Kontrahovanie sa zvýšilo o 427,61 mil. EUR a čerpanie o 527,77 mil. EUR, pričom najvyššiu dynamiku zaznamenalo čerpanie (+4,2 p. b.). Finančný záväzok N+3 na rok 2026 zostáva splnený a aktuálne sa čerpá záväzok pre rok 2027. Slabším miestom zostáva plnenie harmonogramu výziev, ktoré za 3. štvrťrok dosiahlo 35,86 % plánovaného finančného objemu.

Alokácia: **12,59 mld. EUR**
Vyhlásené výzvy: **403 v objeme 11,75 mld. EUR**, t.j. **93,3 %** alokácie
Kontrahovanie: **9,02 mld. EUR**, t.j. **71,6 %** alokácie
Čerpanie: **2,93 mld. EUR**, t.j. **23,3 %** alokácie
Počet predložených žiadostí o NFP: 8 343, z ktorých bolo zatiaľ **schválených 4 839**.

Pokrok od začiatku roka:

- **Nárast vo vyhlásených výzvach o** 54 výziev vo výške **712,74 mil. EUR** (z 87,6 % na 93,3 %) + 5,7 p. b.
- **Nárast kontrahovania o 1,74 mld. EUR** (z 57,7 % na 71,6 %) + 13,9 p. b.
- **Nárast čerpania o 1,32 mld. EUR** (z 12,8 % na 23,3 %) + 10,5 p. b.

Pokrok za 3. štvrtok 2026:


- **Nárast vo vyhlásených výzvach o** 25 výziev vo výške **237,98 mil. EUR** (z 91,4 % na 93,3 %) + 1,9 p. b.
- **Nárast kontrahovania o 427,61 mil. EUR** (zo 68,2 % na 71,6 %) + 3,4 p. b.
- **Nárast čerpania o 527,77 mil. EUR** (z 19,1 % na 23,3%) + 4,2 p. b.
- **Nárast počtu predložených žiadostí : o 929**
- **Nárast počtu schválených žiadostí: o 311**

Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.

3. Stav implementácie P SK podľa rozdelenia na implementujúce subjekty

Na základe Zmluvy o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu pre P SK sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením (ďalej len „zmluva o poverení“) bola riadiacim orgánom pre P SK pridelená jednotlivým sprostredkovateľským orgánom zodpovednosť za implementáciu časti alokácie P SK. **Na implementácii P SK sa podieľa spolu 10 implementujúcich subjektov (sprostredkovateľských orgánov).**

Graf č. 1 Porovnanie stavu implementácie jednotlivých implementujúcich subjektov k 30. 09. 2026

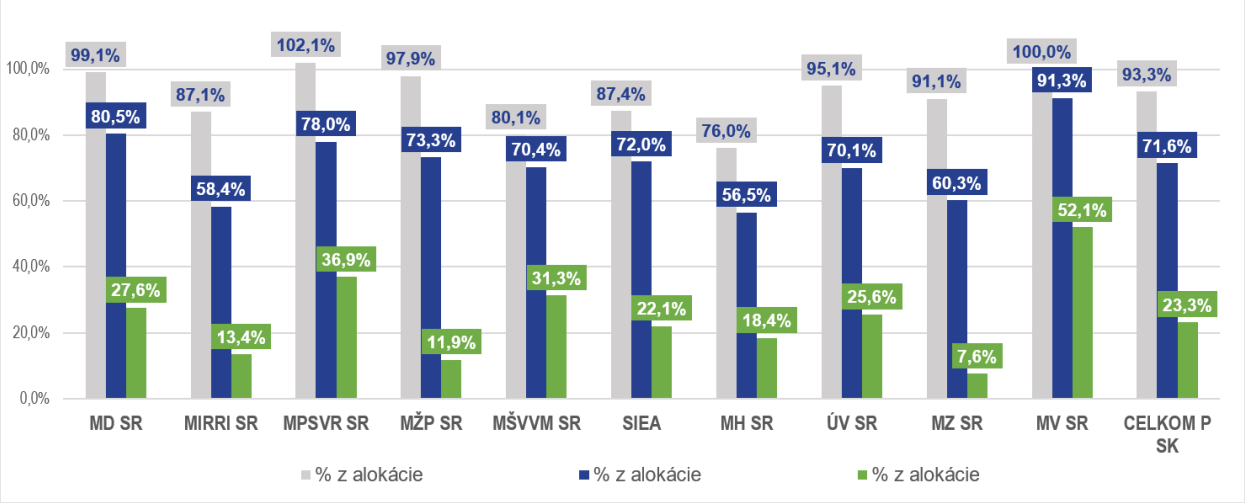

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 10. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie (za FST k 01.10.2026)

Tabuľka č. 2 Prehľad stavu implementácie P SK podľa jednotlivých implementujúcich subjektov k 30. 09. 2026

Rezort	Alokácia EÚ zdroj	Výzvy		Kontrahovanie		Čerpanie	
		EÚ zdroj	%z alokácie	EÚ zdroj	%z alokácie	EÚ zdroj	%z alokácie
MD SR	**3 382 120 791**	3 352 778 139	**99,1%**	2 723 236 606	**80,5%**	935 049 478	**27,6%**
MIRRI SR	**2 435 055 747**	2 121 932 444	**87,1%**	1 421 226 527	**58,4%**	326 973 539	**13,4%**
MPSVR SR	**1 808 615 613**	1 845 913 278	**102,1%**	1 410 880 512	**78,0%**	667 939 220	**36,9%**
MŽP SR	**1 576 863 107**	1 544 368 748	**97,9%**	1 155 351 999	**73,3%**	187 183 963	**11,9%**
MŠVVM SR	**1 021 277 277**	818 251 987	**80,1%**	718 574 530	**70,4%**	320 093 629	**31,3%**
SIEA	**896 271 945**	783 242 341	**87,4%**	645 566 057	**72,0%**	197 817 459	**22,1%**
MH SR	**572 825 210**	435 445 992	**76,0%**	323 873 741	**56,5%**	105 668 750	**18,4%**
ÚV SR	**437 000 000**	415 450 708	**95,1%**	306 233 619	**70,1%**	111 883 467	**25,6%**
MZ SR	**364 982 422**	332 354 764	**91,1%**	220 201 046	**60,3%**	27 898 636	**7,6%**
MV SR	**98 722 821**	98 722 821	**100,0%**	90 158 678	**91,3%**	51 472 810	**52,1%**
CELKOM P SK	**12 593 734 933**	**11 748 461 222**	**93,3%**	**9 015 303 316**	**71,6%**	**2 931 980 952**	**23,3%**

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 10. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie (za FST k 01.10.2026)

Tabuľka č. 3 Nárast kontrahovania a čerpania za 3Q 2026

Rezort	Nárast kontrahovania		Nárast čerpania	
	v EUR	p. b.	v EUR	p. b.
MD SR	37 975 425	1,17 p. b.	191 900 361	5,69 p. b.
MIRRI SR	63 064 267	2,54 p. b.	105 211 612	4,31 p. b.
MPSVR SR	66 909 847	3,86 p. b.	89 279 581	5,01 p. b.
MŽP SR	65 194 788	4,13 p. b.	18 348 905	1,16 p. b.
MŠVVM SR	34 106 856	3,34 p. b.	34 429 997	3,37 p. b.
SIEA	67 150 340	7,49 p. b.	19 201 288	2,14 p. b.
MH SR	11 518 329	2,01 p. b.	32 427 887	5,66 p. b.
ÚV SR	7 316 020	0,80 p. b.	11 089 173	2,24 p. b.
MZ SR	40 537 143	11,31 p. b.	13 192 772	3,63 p. b.
MV SR	33 835 565	34,27 p. b.	12 692 304	12,86 p. b.
CELKOM P SK	**427 608 581**	**3,40 p. b.**	**527 773 881**	**4,19 p. b.**

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01.07.2026 a 01.10.2026)

V rámci kontrahovania bol, v pomere k pridelenej alokácie, zaznamenaný najväčší pokrok pri MV SR (+ 34,27 p. b.), MZ SR (+ 11,31 p. b.) a SIEA (+7,49 p. b.).

Najvyšší nárast podielu čerpania na pridelenej alokácii v 3. štvrťroku 2026 zaznamenali MV SR (+12,86 p. b.), MD SR (+5,69 p. b.) a MH SR (+5,66 p. b.).

Nárast čerpania pod úrovňou priemeru P SK za 3. štvrťrok zaznamenali MŽP SR (+1,16 p. b.), SIEA (+2,14 p. b.), ÚV SR (+2,24 p. b.) a MŠVVM SR (+3,37 p. b.).

Najväčší podiel na náraste čerpania P SK (527,77 mil. EUR) mali rezorty **MD SR** (191,9 mil. EUR**), MIRRI SR** (105,21 mil. EUR) a **MPSVR SR** (89,28 mil. EUR). Spolu tvoria **73,21 % z celkového prírastku čerpania.**

3.1 Prehľad vyhlasovania výziev a plnenie harmonogramu výziev na 3Q 2026 (verzia 3.1)

Od začiatku programového obdobia do 30. 09. 2026 bolo celkovo vyhlásených **403 výziev** s celkovým objemom **11 748,46 mil. EUR, čo predstavuje 93,29 % alokácie PSK.** Naďalej ostáva vyhlásiť výzvy v sume 845,27 mil. EUR.


Tabuľka č. 4 Prehľad vyhlasovania výziev

Rezort	Alokácia EÚ zdroj	Výzvy EÚ zdroj	Potrebné vyhlásiť EÚ zdroj	% z alokácie
MD SR	3 382 120 791	3 352 778 139	29 342 652	99,13%
MIRRI SR	2 435 055 747	2 121 932 444	313 123 303	87,14%
MPSVR SR	1 808 615 613	1 845 913 278	- 37 297 665	102,06%
MŽP SR	1 576 863 107	1 544 368 748	32 494 359	97,94%
MŠVVM SR	1 021 277 277	818 251 987	203 025 290	80,12%
SIEA	896 271 945	783 242 341	113 029 604	87,39%
MH SR	572 825 210	435 445 992	137 379 218	76,02%
ÚV SR	437 000 000	415 450 708	21 549 292	95,07%
MZ SR	364 982 422	332 354 764	32 627 658	91,06%
MV SR	98 722 821	98 722 821	-	100,00%
CELKOM P SK	**12 593 734 933**	**11 748 461 222**	**845 273 711**	**93,29%**

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 10. 2026) - výzvy

MPSVR SR a MV SR vyhlásili výzvy na 100 % pridelenej alokácie. Nad 90 % pridelenej alokácie vyhlásili výzvy MD SR, MŽP SR, ÚV SR a MZ SR. Vyhlásené výzvy pod 90 % pridelenej alokácie majú rezorty MIRRI SR, MŠVVM SR, SIEA a MH SR.

Graf č. 2 Podiel vyhlásených výziev na pridelenej alokácii

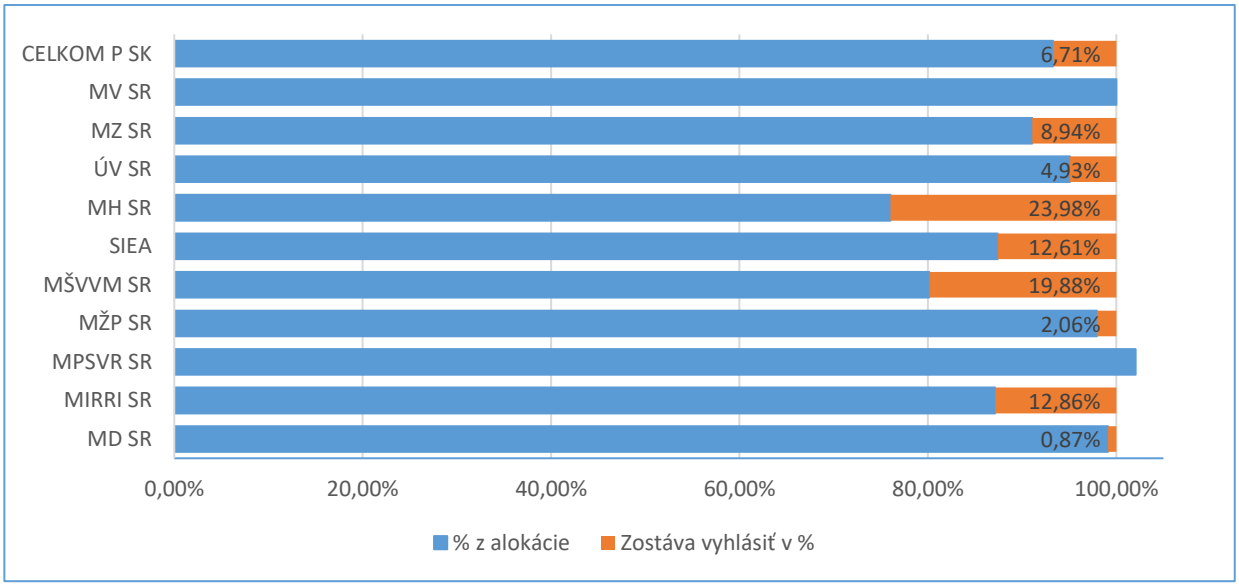


Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 10. 2026) - výzvy

Vyhodnotenie harmonogramu plánovaných výziev P SK za 3Q 2026 (verzia 3.1)

Na 3. štvrťrok 2026 bolo podľa harmonogramu naplánovaných **84 výziev v objeme 1 009,95 mil. EUR**. K 30. 09. 2026 bolo vyhlásených **24 výziev v objeme 362,12 mil. EUR**, čo predstavuje plnenie harmonogramu na úrovni **28,57 % podľa počtu výziev a 35,86 % podľa finančného objemu**.

MPSVR SR plánovalo vyhlásiť 9 výziev, z toho vyhlásilo 6 výziev, čím splnilo plán na 66,67 %. MZ SR a ÚV SR plánovali vyhlásiť 5 výziev, z toho vyhlásili 3 výzvy, čím splnili plán na 60,00 %. MD SR plánovalo vyhlásiť 6 výziev, z toho vyhlásilo len 2 výzvy, MH SR a MŽP SR plánovali vyhlásiť 3 výzvy, vyhlásili len 1 výzvu, čím splnili svoje plány na 33,33 %. MŠVVM SR plánovalo vyhlásiť 11 výziev, z toho vyhlásilo 3 výzvy, čím splnilo plán na 27,27 %. MIRRI SR plánovalo vyhlásiť 41 výziev, z toho však vyhlásilo len 5 výziev, čím splnilo plán na 12,20 %. SIEA plánovala 1 výzvu, ktorú nestihla vyhlásiť. MV SR neplánovalo v 3. štvrťroku vyhlásiť ďalšiu výzvu, keďže výzvy už boli vyhlásené na **100 % pridelenej alokácie**. Bližšie informácie k objemu výziev sú uvedené v tabuľke č. 5.

Tabuľka č. 5 Prehľad plánovaných a vyhlásených výziev za 3Q 2026 z hľadiska objemu (mil. EUR)

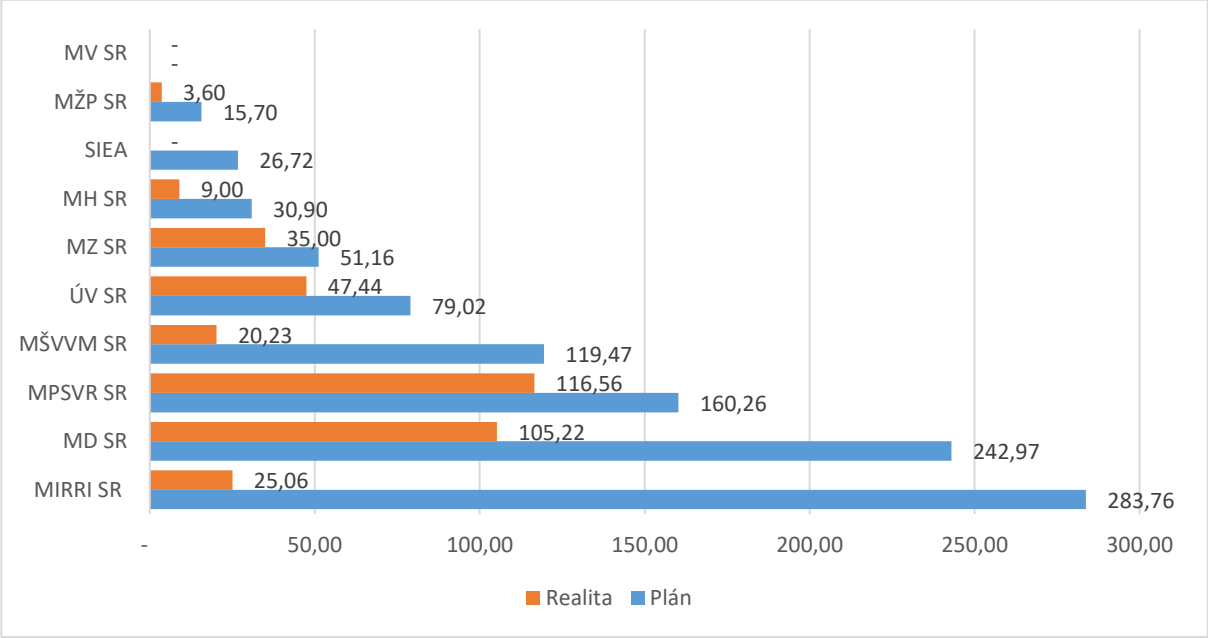

Zdroj: Harmonogram plánovaných výziev P SK na rok 2026 verzia 3.1, ITMS21+ export dát 01. 10. 2026

4. Plnenie pravidla N+3

Rok 2025

K 31. 12. 2025 bolo potrebné vyčerpať minimálne 1,47 mld. EUR[1] v rámci P SK. Tento limit sa podarilo splniť už k 30. 11. 2025 a k 31. 12. 2025 bolo dosiahnuté 110 %-né plnenie finančného záväzku na rok 2025.

Rok 2026

K 31. 12. 2026 bolo potrebné vyčerpať kumulatívne minimálne 2,21 mld. EUR[2] v rámci P SK. **Finančný záväzok pre rok 2026 bol úspešne naplnený v predstihu, už ku koncu mája 2026.** Aktuálne sa čerpá záväzok pre rok 2027 a to na úrovni záväzku za prvých päť mesiacov.

V ďalších rokoch sa však požadovaný objem čerpania výrazne zvyšuje. V rokoch **2027 až 2029 bude potrebné každoročne vyčerpať približne cca. 2,09 mld. EUR** a v roku **2030 viac ako 4,10 mld. EUR**. Z pohľadu riadenia

[1] Kumulatívna suma N+3 pre rok 2025 a 2026 bola znížená k 31. 07. 2025 na základe vyplatenia zálohy na STEP (30 % z alokácie 1P3).
[2] Minimálny objem čerpania v roku 2026 bol výrazne znížený (zníženie o ročnú a dodatočné jednorazové zálohové platby vo výške 1,43 mld. EUR), a to najmä zásluhou využitia nových priorít a flexibilít v rámci nového legislatívneho balíka Európskej únie s názvom „Modernizovaná politika súdržnosti“, prostredníctvom predloženia revízie P SK na schválenie Európskej komisii v termíne do 31. 12. 2025.

programu je preto dôležité pokračovať vo vysokom tempe čerpania a vytvárať rezervu voči budúcim záväzkom N+3.

Riziko dekomitmentu sa bude postupne zvyšovať najmä ku koncu programového obdobia, keď sa vysoké požiadavky na čerpanie P SK budú prekrývať so začiatkom implementácie programového obdobia 2028 – 2034. Dodatočný tlak môže predstavovať aj pripravovaný regulačný rámec pre obdobie 2028 – 2034, ktorý v aktuálnom návrhu Európskej komisie počíta s uplatňovaním prísnejšieho pravidla **N+1**.

5. Opatrenia realizované v 3. štvrťroku 2026

Na eliminovanie rizika dekomitmentu v ďalších rokoch prijíma RO P SK v spolupráci s poskytovateľmi **súbor opatrení zameraných na 2 hlavné oblasti:**

- revízia P SK a realokácie;
- zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK;

5.1 Zmena Programu Slovensko a realokácia finančných prostriedkov

V súčasnosti pokračuje proces schvaľovania štvrtej zmeny P SK (verzia 5.2), ktorá nadväzuje na doterajší priebeh implementácie programu a reflektuje identifikované potreby jeho ďalšej realizácie. Návrh zmeny bol schválený Monitorovacím výborom pre P SK dňa 22. júla 2026 a následne predložený Európskej komisii na posúdenie a schválenie.

Predkladané úpravy vychádzajú zo skúseností získaných počas implementácie zo strany jednotlivých poskytovateľov a sú zamerané na zvýšenie efektívnosti riadenia programu, zrýchlenie jeho implementácie a lepšie zohľadnenie aktuálneho dopytu a absorpčných možností v jednotlivých oblastiach podpory.

Súčasne reagujú na meniace sa hospodárske a spoločenské podmienky a potrebu pružne reflektovať aktuálne rozvojové výzvy Slovenskej republiky. Navrhované zmeny majú finančný, technický aj vecný charakter a boli v plnom rozsahu zapracované do Programu Slovensko, verzia 5.2, ktorá bola schválená Monitorovacím výborom dňa 22. júla 2026.

5.2 Zvýšenie dohľadu nad implementáciou P SK

- ✓ **Zintenzívnenie bilaterálnych stretnutí s sprostredkovateľskými orgánmi**

Bilaterálne stretnutia na úrovni štátnych tajomníkov sa uskutočňujú v pravidelnej periodicite so sprostredkovateľskými orgánmi, resp. implementačnými sekciami MIRRI SR. **Za tretí štvrťrok 2026 sa uskutočnili dve kolá bilaterálnych stretnutí, spolu 19 stretnutí medzi RO-SO/IS.**

Predmetom rokovaní je diskusia k aktuálnemu stavu implementácie, podrobné vyhodnocovanie implementačných dát, identifikovaných rizík a opatrení na zrýchlenie kontrahovania a čerpania.

- ✓ **Zavedenie režimu zostreného monitorovania implementácie vo vzťahu k Sekcii implementácie projektov informatizácie MIRRI SR (SIPI), Sekcii spravodlivej transformácie MIRRI SR (SST) a Ministerstvu zdravotníctva SR (MZ SR)**

Zostrený režim monitorovania je zameraný na prípravu a vyhlasovanie výziev, výberový proces ŽoNFP, kontrahovanie schválených projektov, plnenie plánov čerpania a priebežné vyhodnocovanie identifikovaných rizík a prijatých opatrení. Plnenie stanovených krokov a termínov sa vyhodnocuje v dvojtýždennom intervale.

- ✓ **Priebežný monitoring plnenia míľnika kontrahovania a limitu čerpania N+3 pre rok 2026**

- ✓ **Implementácia Integrovaných územných investícií (ďalej len „IÚI“)**

Zaznamenáva v sledovanom období stabilný progres, pričom vo fáze schvaľovania projektových zámerov IÚI sa podarilo k 30. 09. 2026 dosiahnuť úroveň 97 % z celkovej alokácie. V nadväzujúcom procese predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) evidujeme objem na úrovni 80 % alokovaných finančných

prostriedkov, z čoho schválením k dnešnému dňu úspešne prešli ŽoNFP v celkovom objeme 66 % alokácie. Pozitívny vývoj sa premieta aj do zmluvnej fázy, kde úroveň kontrahovania vzrástla na 52 %. Samotná finančná realizácia vyjadrená stavom čerpania, teda objemom schválených súhrnných žiadostí o platbu, sa aktuálne nachádza na úrovni 10 % z celkového rozpočtu IÚI.

- ✓ **Aktualizácia metodických a riadiacich dokumentov**

Riadiaci orgán vydal a aktualizoval nasledovné metodické dokumenty, ktoré majú priamy vplyv na implementáciu P SK. Zoznam dokumentov je uvedený v poradí, v akom boli v sledovanom období vydané a účinné (od najstaršieho po najnovšie):

- Aktualizácia Metodického dokumentu RO P SR č. 14 – Príručka k finančnej kontrole projektu s rizikovo orientovaným prístupom (Príručka ku kontrole);
- Aktualizácia Metodického dokumentu RO P SK č. 7 - Metodické usmernenie k uplatňovaniu zásady „nespôsobovať významnú škodu“;
- Vydanie Metodického dokumentu RO P SK č. 26 – Príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania;
- Aktualizácia Metodického dokumentu RO P SK č. 23 – Vzor manuálu procedúr RO/SO;

Aktualizácia Metodického dokumentu RO P SK č. 3 - Metodické usmernenie k výberu odborných hodnotiteľov

Príloha 1: Stav implementácie P SK k 30. 09. 2026 v rozdelení na ciele politiky a priority

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 – 2027	Výzvy			Kontrahovanie			Čerpanie	
				Alokácia EÚ zdroj	Počet výziev	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	Počet projektov	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj	EÚ zdroj	% z alokácie EÚ zdroj
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 265 102 507	66	1 118 638 900	88,42%	293	864 632 976	68,34%	141 240 274	11,16%
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	23 709 407	100,00%	1	23 709 407	100,00%	0	0,00%
	1P3	STEP	EFRR	321 022 377	10	118 028 064	36,77%	3	38 976 875	12,14%	404 332	0,13%
	1P5	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 1	**EFRR**	**1 631 043 252**	**77**	**1 260 376 371**	**77,27%**	**297**	**927 319 259**	**56,85%**	**141 644 606**	**8,68%**
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	12	1 146 907 447	94,28%	570	1 013 948 877	83,35%	522 879 477	42,98%
	2P2	Životné prostredie	EFRR/KF	1 848 618 253	54	1 869 802 825	101,15%	1 057	1 383 998 709	74,87%	257 576 780	13,93%
	2P3	Udržateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 853 987	8	864 628 238	102,22%	94	392 505 189	46,40%	188 648 714	22,30%
	2P4	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	1	2 765 237	4,41%	-	0	0,00%	0	0,00%
	2P5	Dostupné a udržateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	2P6	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 2	**EFRR/KF**	**4 024 824 528**	**75**	**3 884 103 746**	**96,50%**	**1 721**	**2 790 452 774**	**69,33%**	**969 104 972**	**24,08%**
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 022 985 448	31	2 326 406 430	115,00%	308	2 119 574 731	104,77%	449 741 619	22,23%
	3P2	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	2	120 396 911	22,39%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 3	**EFRR/KF**	**2 560 800 221**	**33**	**2 446 803 341**	**95,55%**	**308**	**2 119 574 731**	**82,77%**	**449 741 619**	**17,56%**
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	528 938 339	29	611 368 074	115,58%	149	479 898 710	90,73%	233 260 388	44,10%
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 514 896	20	611 389 855	94,71%	389	564 909 958	87,51%	298 403 350	46,23%
	4P3	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inkluziu	EFRR/ESF+	164 840 656	15	148 160 452	89,88%	47	108 320 987	65,71%	23 012 066	13,96%
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	17	284 509 516	98,68%	147	181 001 662	62,78%	47 407 400	16,44%
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	993 626 389	45	1 009 347 503	101,58%	162	809 584 501	81,48%	368 306 858	37,07%
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komunít	EFRR/ESF+	279 200 000	14	265 078 110	94,94%	671	202 182 844	72,42%	105 703 781	37,86%
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	6	44 388 164	64,15%	65	35 995 635	52,02%	4 133 753	5,97%
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	69 196 597	1	69 196 597	100,00%	1	69 196 597	100,00%	10 726 365	15,50%
	4P9	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	1	30 000 000	40,54%	-	0	0,00%	0	0,00%
	4P10	Zručnosti v civilnej pripravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 4	**EFRR/ESF+**	**3 115 210 625**	**135**	**3 073 438 271**	**98,66%**	**1 504**	**2 451 090 894**	**78,68%**	**1 090 953 961**	**35,02%**
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	384 847 007	6	383 215 984	99,58%	312	205 253 162	53,33%	36 222 789	9,41%
	5P2	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
	5P3	Civilná pripravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM cieľ 5	**EFRR**	**429 434 284**	**6**	**383 215 984**	**89,24%**	**312**	**205 253 162**	**47,80%**	**36 222 789**	**8,44%**
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	17	377 200 019	86,68%	77	296 226 939	68,07%	96 900 413	22,27%
	8P2	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0,00%	-	0	0,00%	0	0,00%
		CELKOM FST	**FST**	**440 658 242**	**17**	**377 200 019**	**85,60%**	**77**	**296 226 939**	**67,22%**	**96 900 413**	**21,99%**
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	49	212 297 806	89,97%	62	154 146 076	65,33%	96 451 350	40,88%
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	4	25 282 761	48,97%	3	8 368 114	16,21%	7 652 283	14,82%
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	9	69 017 811	80,43%	12	58 871 619	68,61%	39 404 445	45,92%
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	3	16 725 113	91,09%	2	3 999 747	21,78%	3 904 513	21,27%
		CELKOM TP		**391 763 781**	**65**	**323 323 491**	**82,53%**	**79**	**225 385 556**	**57,53%**	**147 412 591**	**37,63%**
		CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		**12 593 734 933**	**403**	**11 748 461 222**	**93,29%**	**4 286**	**9 015 303 316**	**71,59%**	**2 931 980 952**	**23,28%**

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 10. 2026) - výzvy a kontrahovanie, PO (MF SR) – čerpanie (za FST k 01.10.2026)

V prípade, že výzva alebo projekt sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.

Príloha 2: Stav prijatých a schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) k 30. 09. 2026

Cieľ politiky alebo technická pomoc	Priorita	Názov priority	Fond	2021 – 2027	Prijaté ŽoNFP			Schválené ŽoNFP		
				Alokácia EÚ zdroj	Počet ŽoNFP	COV	NFP	Počet ŽoNFP	COV	NFP
1	1P1	Veda, výskum a inovácie	EFRR	1 265 102 507	769	2 507 053 509	2 265 224 053	366	1 413 262 322	1 328 560 432
	1P2	Digitálna pripojiteľnosť	EFRR	23 709 407	1	29 999 376	29 999 376	1	29 999 376	29 999 376
	1P3	STEP	EFRR	321 022 377	56	86 424 741	79 134 346	4	64 913 157	57 976 875
	1P5	Podpora obranných spôsobilostí	EFRR	21 208 961	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 1	**EFRR**	**1 631 043 252**	**826**	**2 623 477 626**	**2 374 357 774**	**371**	**1 508 174 855**	**1 416 536 683**
2	2P1	Energetická efektívnosť a dekarbonizácia	EFRR/KF	1 216 437 051	1 514	2 222 008 334	2 045 585 011	621	1 378 229 633	1 306 026 437
	2P2	Životné prostredie	EFRR/KF	1 848 618 253	1 678	2 527 254 907	2 393 519 656	1 173	1 872 521 972	1 780 101 670
	2P3	Udržateľná mestská mobilita	EFRR/KF	845 853 987	202	848 541 505	833 374 961	152	645 811 098	630 762 680
	2P4	Odolné vodné hospodárstvo	EFRR/KF	62 765 237	-	0	0	-	0	0
	2P5	Dostupné a udržateľné bývanie	EFRR/KF	31 650 000	-	0	0	-	0	0
	2P6	Energetická infraštruktúra	EFRR	19 500 000	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 2	**EFRR/KF**	**4 024 824 528**	**3 394**	**5 597 804 746**	**5 272 479 628**	**1 946**	**3 896 562 702**	**3 716 890 788**
3	3P1	Doprava	EFRR/KF	2 022 985 448	587	2 869 832 420	2 846 456 207	354	2 734 328 012	2 714 782 883
	3P2	Obrana a bezpečnosť	EFRR/KF	537 814 773	2	141 643 425	141 643 425	2	141 643 425	141 643 425
		CELKOM cieľ 3	**EFRR/KF**	**2 560 800 221**	**589**	**3 011 475 845**	**2 988 099 632**	**356**	**2 875 971 437**	**2 856 426 308**
4	4P1	Adaptívny a prístupný trh práce	EFRR/ESF+	528 938 339	471	690 612 669	687 877 152	160	606 599 768	604 222 050
	4P2	Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie	EFRR/ESF+	645 514 896	440	743 235 588	716 512 420	404	712 527 016	687 429 588
	4P3	Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu a inkluziu	EFRR/ESF+	164 840 656	374	206 216 176	201 239 379	49	145 615 442	142 382 571
	4P4	Záruka pre mladých	ESF+	288 319 151	440	360 051 746	357 736 548	153	286 925 086	284 609 888
	4P5	Aktívne začlenenie a dostupné služby	EFRR/ESF+	993 626 389	229	1 238 715 795	1 222 166 910	178	1 172 194 764	1 160 364 245
	4P6	Aktívne začlenenie rómskych komunít	EFRR/ESF+	279 200 000	1 140	405 759 885	404 516 417	696	300 137 138	300 137 138
	4P7	Sociálne inovácie a experimenty	ESF+	69 196 597	121	63 265 508	60 243 738	77	44 917 725	42 813 348
	4P8	Potravinová a materiálna deprivácia	ESF+	69 196 597	1	63 525 556	63 525 556	1	63 525 556	63 525 556
	4P9	Dostupné bývanie	EFRR	74 000 000	3	4 571 559	4 571 559	-	0	0
	4P10	Zručnosti v civilnej pripravenosti	ESF+	2 378 000	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 4	**EFRR/ESF+**	**3 115 210 625**	**2 825**	**3 775 954 481**	**3 718 389 680**	**1 587**	**3 332 442 495**	**3 285 484 384**
5	5P1	Moderné regióny	EFRR	384 847 007	467	427 265 176	391 393 674	395	343 391 429	314 905 304
	5P2	Dostupné bývanie v regiónoch	EFRR	41 532 797	-	0	0	-	0	0
	5P3	Civilná pripravenosť v regiónoch	EFRR	3 054 480	-	0	0	-	0	0
		CELKOM cieľ 5	**EFRR**	**429 434 284**	**467**	**427 265 176**	**391 393 674**	**395**	**343 391 429**	**314 905 304**
FST	8P1	Fond spravodlivej transformácie	FST	435 158 242	164	707 863 086	517 935 413	115	611 599 916	434 969 713
	8P2	Fond spravodlivej transformácie - MPS	FST	5 500 000	-	0	0	-	0	0
		CELKOM FST	**FST**	**440 658 242**	**164**	**707 863 086**	**517 935 413**	**115**	**611 599 916**	**434 969 713**
TP	7P1	Technická pomoc EFRR	EFRR	235 964 660	83	275 919 104	274 404 521	67	225 498 793	224 456 168
	7P2	Technická pomoc KF	KF	51 632 244	3	12 375 665	12 375 665	3	12 375 665	12 375 665
	7P3	Technická pomoc ESF+	ESF+	85 806 118	13	91 733 746	91 733 746	12	80 534 100	80 534 100
	7P4	Technická pomoc FST	FST	18 360 759	3	9 217 345	9 217 345	3	9 217 345	9 217 345
		CELKOM TP		**391 763 781**	**102**	**389 245 860**	**387 731 276**	**85**	**327 625 904**	**326 583 278**
		CELKOM PROGRAM SLOVENSKO		**12 593 734 933**	**8 343**	**16 533 086 820**	**15 650 387 077**	**4 839**	**12 895 768 737**	**12 351 796 459**

Zdroj: ITMS21+ (export dát 01. 10. 2026); COV= celkové oprávnené výdavky. V prípade, že ŽoNFP sa týka viacerých priorít/cieľov politiky, zahŕňa sa do počtu každej priority/cieľa politiky, ktorej sa týka. Jedinečný počet je uvedený za program celkom.
